La durata delle varie fasi lavorative è espressa in giorni lavorativi - La durata complessiva del cantiere è pari a 330 giorni naturali e consecutivi

Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO BASE CANTIERE	229 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
CAMPOMAGGIORE CENTRO	36 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im	1 g
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	34 g
Scavo a sezione obbligata	34 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	34 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	14 g
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	34 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	34 g
Formazione di fondazione stradale	34 g
Formazione di manto di usura e collegamento	8 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
CAMPOMAGGIORE-SALARIA	16 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im	1 g
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Scavo a sezione obbligata	16 g
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	4 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	16 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	9 g
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	16 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	16 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
SALARIA-TALOCCI	63 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im	1 g
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	6 g
Scavo a sezione obbligata	61 g
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	10 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	61 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	40 g
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	50 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	50 g
Formazione di manto di usura e collegamento	5 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
VALLE FALSA	30 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im	1 g
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	6 g
Scavo a sezione obbligata	30 g
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	5 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	30 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	30 g
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	30 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	30 g
Formazione di manto di usura e collegamento	5 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
ATTRAVERSAMENTO SALARIA	1 g
Posa di conduttura fognaria tramite microtunneling	1 g
ATTRAVERSAMENTO FOSSO MURELLO	4 g
Posa di conduttura idrica in acciaio	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	4 g
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	4 g
SOLLEVAMENTO CAMPOMAGGIORE	20 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1 g
Posa di conduttura elettrica	3 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	5 g
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	5 g
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	4 g
Posa di organi di intercettazione e regolazione	1 g
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di sollevamenti	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi	3 g
SOLLEVAMENTO CANNETO	20 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1 g
Posa di conduttura elettrica	3 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	5 g
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	5 g
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	4 g
Posa di organi di intercettazione e regolazione	1 g
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di sollevamenti	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi	3 g
SOLLEVAMENTO VALLE FALSA	20 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1 g
Posa di conduttura elettrica	3 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	5 g
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	5 g
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	4 g
Posa di organi di intercettazione e regolazione	1 g
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di sollevamenti	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi	3 g
SOLLEVAMENTO ZONA ASI	20 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1 g
Posa di conduttura elettrica	3 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	5 g
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	5 g
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	4 g
Posa di organi di intercettazione e regolazione	1 g
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di sollevamenti	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi	3 g

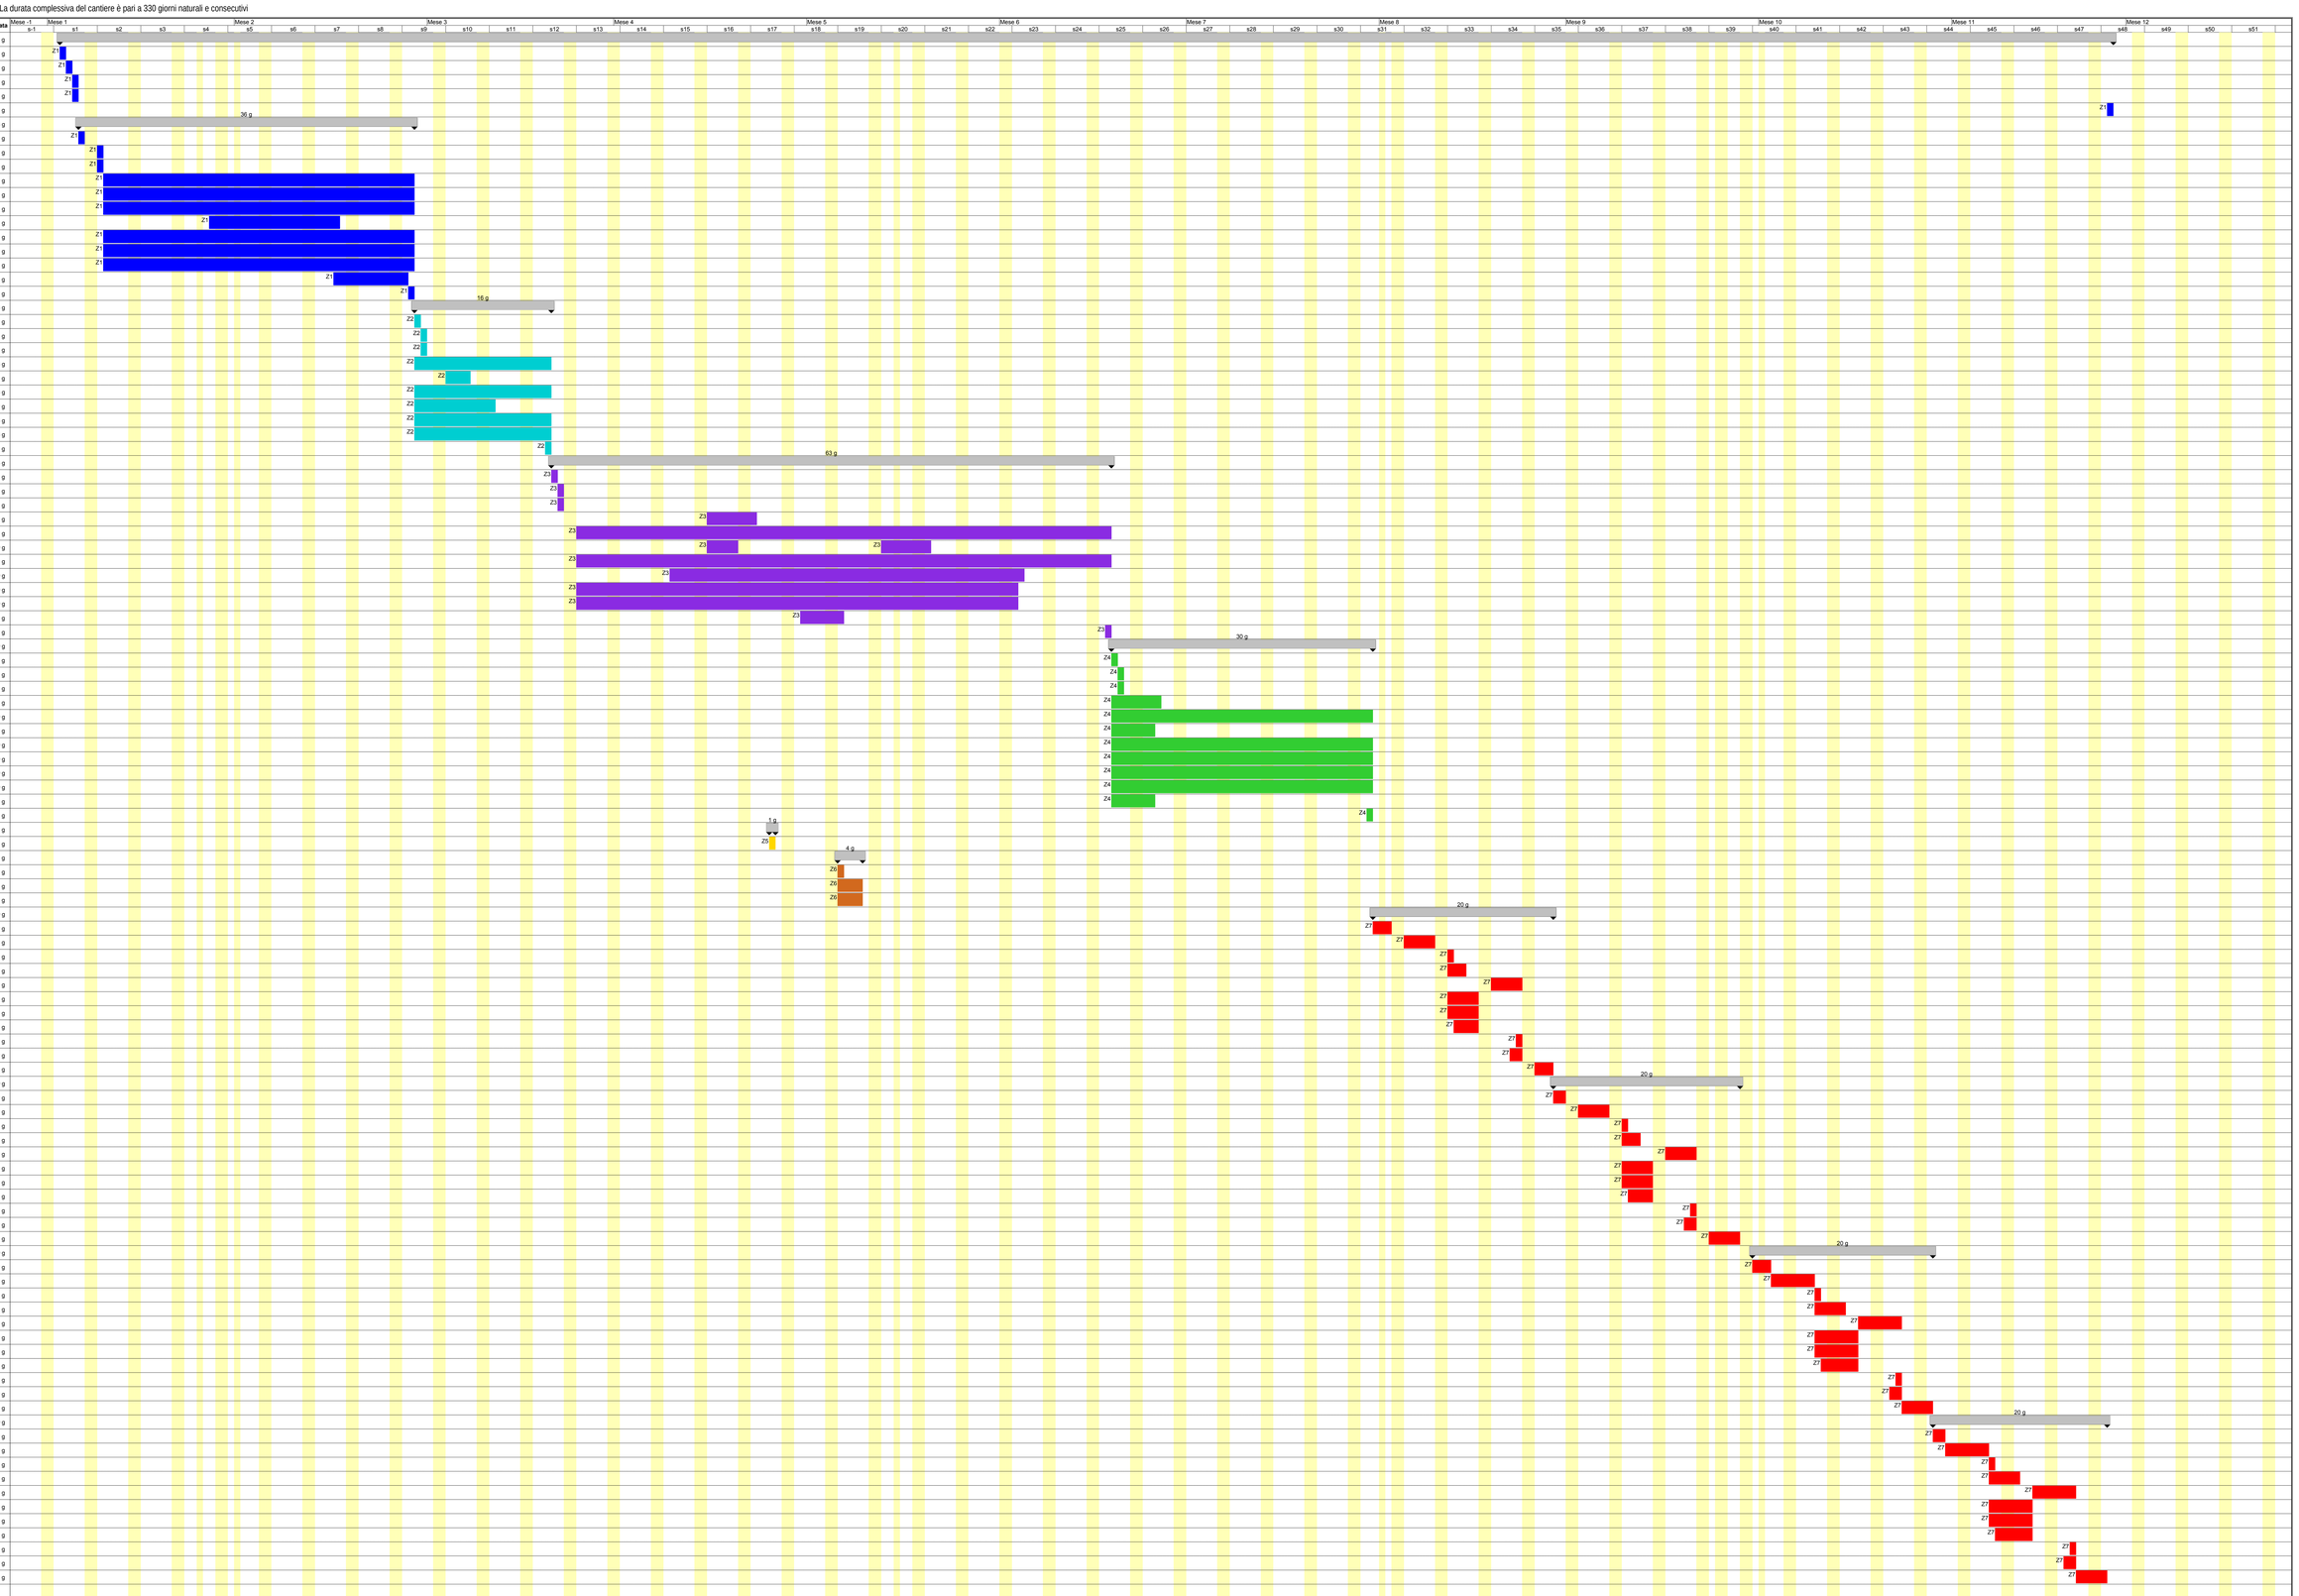

LEGENDA Zona:

Z1 = CAMPOMAGGIORE CENTRO
Z2 = CAMPOMAGGIORE-SALARIA
Z3 = SALARIA-TALOCCI
Z4 = VALLE FALSA
Z5 = ATTRAVERSAMENTO SALARIA
Z6 = ATTRAVERSAMENTO FOSSI
Z7 = STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
